



สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง ตำบลนาโตะหมิง อำเภอเมือง
ตรัง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๒๔ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง โดย
นายสรุฒิ นาคะพงศ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ภูทองกรู๊ป การโยธา จำกัด
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดตรัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ ๕๙/๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยนาย
วิศิษฐ์ เก่งธนทรัพย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรอง ของสำนักทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัท จังหวัดพัทลุง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ แนบท้าย
สัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ได้ดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๕๐-๐๑๖ สายโคกหัวน - พรุละหมาด (ตอน ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลนา
โตะหมิง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๗๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) ตามแบบรูปและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่ง
สัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อ
ใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป	จำนวน	๑๕	(สิบห้า)	หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ หนังสือส่งมอบพื้นที่	จำนวน	๑	(หนึ่ง)	หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน	๒	(สอง)	หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา	จำนวน	๕๐	(ห้าสิบ)	หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ สูตรปรับราคา	จำนวน	๑๐	(สิบ)	หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ แบบรูปและรายการงานก่อสร้าง	จำนวน	๕	(ห้า)	หน้า
๒.๗ ผนวก ๗ ตารางเปรียบเทียบราคากลางกับราคาของผู้รับจ้างเสนอ	จำนวน	๒	(สอง)	หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสรุฒิ นาคะพงศ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิศิษฐ์ เก่งธนทรัพย์)
บริษัท ภูทองกรู๊ป การโยธา จำกัด
PHUTHONG GROUP CIVIL CO., LTD.

ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง เลขที่ ๑๐๐๐๗๓๑๔๑๔๕๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๑๘๑,๗๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๖๓๔,๙๙๙.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๓๗,๘๐๓.๖๗ บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามบาทหกสิบบาทเจ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๕๓,๙๙๙.๖๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทหกสิบบาทเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำงาน จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.๕๐-๐๑๖ สายโคกหวาน - พุระหมาด (ตอน ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโตะหมิง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๗๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

งวดสุดท้าย (งวดที่ ๒) เป็นเงินจำนวน ๒,๑๘๐,๙๙๙.๔๐ (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบบาทเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสรวิทย์ นาคะพงศ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิศิษฐ์ เก่งธนทรัพย์)
บริษัท ภูเก็ต กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
PHUTHONGGROUP CIVIL CO.,LTD.

ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน.....บาท(.....-.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.....(.....-.....) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....(หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย).....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้ ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตามจากผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยคืนในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ (-) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสรุฒิ นาคะพงศ์)

(นายวิศิษฐ์ เก่งธนทรัพย์)

บริษัท ภูเก็ตกรุ๊ป การโยธา จำกัด
PHUTHONGGROUP CIVIL CO., LTD.

หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้าง ต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเข้านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสรุฒิ นาคะพงศ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

บริษัท ปุทธรูป (นายวิชาญ เก่งธนทรัพย์)
PHUTHONGGROUP CIVIL CO., LTD.

จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำให้มิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้าง ถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่งผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียด โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการ ทางวิศวกรรม

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสรุฒิ นาคะพงศ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิเศษ คุ้มกันทรัพย์)

บริษัท ภูเก็ตกรุ๊ป จำกัด
PHUTHONGGROUP CIVIL CO., LTD.

หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึง อัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๙,๐๘๗.๕๐ บาท (เก้าพันแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้าง ได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ ที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกิน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรวิทย์ นาคะพงศ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิศิษฐ์ เก่งธนทรัพย์)

บริษัท ภูเก็ต กรุ๊ป การโยธา จำกัด
PHUTHONGGROUP CIVIL CO.,LTD.

กว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อไปแล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก..... หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับปวช. ปวส.และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสรวิทย์ นาคะพงศ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิศิษฐ์ เก่งธนทรัพย์)

บริษัท ภูเก็ตกรุป การโยธา จำกัด
PHUTHONGGROUP CIVIL CO.,LTD.

๒๒.๑ สาขาช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าว ในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือ ทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตาม สัญญาโดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการ ต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตาม ภาคผนวก ภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดย ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่าง ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสรวิทย์ นาคะพงศ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิศิษฐ์ เก่งธนทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวมลฤดี ทองมาก)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอภิญญา สีสุข)

เลขที่โครงการ ๖๘๐๑๙๑๓๓๑๐๓

เลขคุมสัญญา ๖๘๐๓๒๒๐๒๕๐๖๗



(ลงชื่อ).....

(นายสรวิทย์ นาคะพงศ์)



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายวิศิษฐ์ เก่งธนทรัพย์)

ผู้รับจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. 50-016

สายโคกหวาน-พรุละหมาด(ตอน 2) หมู่ที่ 2 ตำบลนาไต่ะหมิง

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 845 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,070 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไต่ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง



บริษัท ภูทองกรุ๊ป การโยธา จำกัด
PHUTHONG GROUP CIVIL CO., LTD.

ผู้ว่าจ้าง.....	ผู้รับจ้าง.....
พยาน.....	พยาน.....
พยาน.....	พยาน.....



สำเนาถูกต้อง
(นายมานิช กงเลียม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบล ไชยเมือง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณถนนสาย 101 - บ้านนา (ถนน)
สายบ้านนา - บ้านนา (ถนน)
หมู่ 2 บ้านนาไชยเมือง
ตำบลไชยเมือง อำเภอนาหว้า จังหวัดบึงกาฬ

สำรวจ

ออกแบบ

ตรวจสอบ

อนุมัติ

วันที่

หน้า


หน้า

TABLE 1. THE BAR SPACING DATA


SLAB THICKNESS (cm)	THE BAR SPACING DATA	SLAB TYPE	THE BAR SPACING DATA	SLAB TYPE
ALL	15	100	12	50
DOOR	15	100	12	50

TABLE 2. THE BAR SPACING DATA

SLAB THICKNESS (cm)	THE BAR SPACING DATA	SLAB TYPE	THE BAR SPACING DATA	SLAB TYPE
ALL	15	100	12	50
DOOR	15	100	12	50



รูปหน้าตัดขวางของรางราง คค.




CONTRACTION JOINT




บริษัท ภูทองกรุ๊ป การโยธา จำกัด
PHU THONG GROUP CIVIL ENGINEERING



EXPANSION JOINT




LONGITUDINAL JOINT

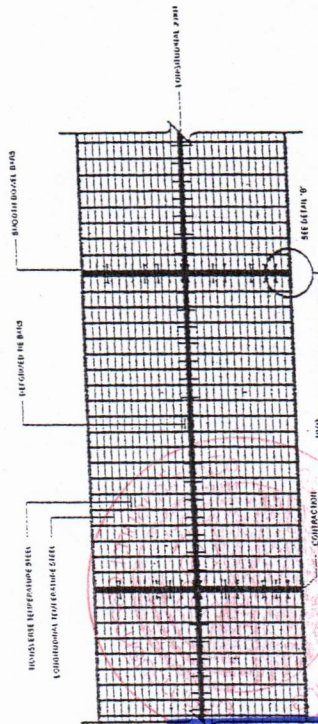

หน้าตัดขวางของรางราง คค.

1. การก่อสร้างให้ใช้เหล็กเสริมที่มีขนาดตามแบบแปลนที่มีอยู่จริง หรือ 100 มม. หรือ 120 มม.
2. EXPANSION JOINT ให้ใช้เหล็กเสริมที่มีขนาดตามแบบแปลนที่มีอยู่จริง หรือ 100 มม. หรือ 120 มม.
3. CONTRACTION JOINT ให้ใช้เหล็กเสริมที่มีขนาดตามแบบแปลนที่มีอยู่จริง หรือ 100 มม. หรือ 120 มม.
4. JOINT FILLER ให้ใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติตามแบบแปลนที่มีอยู่จริง หรือ 100 มม. หรือ 120 มม.
5. การก่อสร้างให้ใช้เหล็กเสริมที่มีขนาดตามแบบแปลนที่มีอยู่จริง หรือ 100 มม. หรือ 120 มม.
6. การก่อสร้างให้ใช้เหล็กเสริมที่มีขนาดตามแบบแปลนที่มีอยู่จริง หรือ 100 มม. หรือ 120 มม.
7. การก่อสร้างให้ใช้เหล็กเสริมที่มีขนาดตามแบบแปลนที่มีอยู่จริง หรือ 100 มม. หรือ 120 มม.
8. การก่อสร้างให้ใช้เหล็กเสริมที่มีขนาดตามแบบแปลนที่มีอยู่จริง หรือ 100 มม. หรือ 120 มม.
9. การก่อสร้างให้ใช้เหล็กเสริมที่มีขนาดตามแบบแปลนที่มีอยู่จริง หรือ 100 มม. หรือ 120 มม.
10. การก่อสร้างให้ใช้เหล็กเสริมที่มีขนาดตามแบบแปลนที่มีอยู่จริง หรือ 100 มม. หรือ 120 มม.
11. การก่อสร้างให้ใช้เหล็กเสริมที่มีขนาดตามแบบแปลนที่มีอยู่จริง หรือ 100 มม. หรือ 120 มม.

สำเนาถูกต้อง
(นายมานะ กิ่งเสียง)
ผู้อำนวยการกองช่าง



CONSTRUCTION JOINT

- การควบคุมการก่อสร้าง
1. ใช้วิธีการก่อสร้างที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
 2. ใช้วัสดุที่มีคุณภาพดี
 3. ใช้แรงงานที่มีฝีมือ
 4. ใช้เครื่องมือที่ทันสมัย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณทางหลวงหมายเลข 305 กม. 85+00 ถึง
สถานีบ้านนา - ห้วยทราย (ตอนต่อ)
ปี 2 ส่วนหน้าใช้ชนิด
งานก่อสร้าง ขั้วหน้าตัด

นาย...
นายอำเภอ...
นายอำเภอ...

นายอำเภอ...
นายอำเภอ...

นายอำเภอ...
นายอำเภอ...

นายอำเภอ...
นายอำเภอ...

นายอำเภอ...
นายอำเภอ...

นายอำเภอ...
นายอำเภอ...

นายอำเภอ...
นายอำเภอ...

CURVE DATA NO. 1										PI. STA. 0+750.000	
?	=	33'-33"-28.00"	LT	E	=	3.480	M.				
D	=	75'-00'-00"		SPEED	=	--	KPH.				
R	=	78.487	M.	SE	=	--	M/M.				
T	=	23.865	M.	T ₈	=	--	M.				
L	=	45.970	M.	W	=	--	M.				
SE. ATTAINED STA.				--		TO STA.		--			
SE. REMOVED STA.				--		TO STA.		--			

CURVE DATA NO. 5													
PI. STA. 1+003.333						PI. STA. 1+003.333							
7	= 28'-20"-17.00"	RT	E	=	0.998	M.	7	= 28'-20"-17.00"	RT	E	=	0.998	M.
D	= 155'-00'-00"		SPEED			KPH.	D	= 155'-00'-00"		SPEED			KPH.
R	= 36.965	M.	SE	=		M/M.	R	= 36.965	M.	SE	=		M/M.
T	= 8.049	M.	Ta	=		M.	T	= 8.049	M.	Ta	=		M.
L	= 16.992	M.	W	=		M.	L	= 16.992	M.	W	=		M.
SE. ATTAINED STA.						TO STA.	SE. ATTAINED STA.						TO STA.
SE. REMOVED STA.						TO STA.	SE. REMOVED STA.						TO STA.

CURVE DATA NO. 9											
PI. STA. 1+335.568											
?	=104'-24'-50.00" LT		E	=	13.977	M.					
D	=259'-00'-00"		SPEED	=	---	KPH.					
R	22.122		SE	=	---	M/M.					
T	25.527		Ta	=	---	M.					
L	40.314		W	=	---	M.					
SE. ATTAINED STA.						=	TO STA.		---		
SE. REMOVED STA.						=	TO STA.		---		

CURVE DATA NO. 2											
PI. STA. 0+837.555											
?	18'-20'-25.00"		RT	E	0.989	M.					
D	75'-00'-00"			SPEED		KPH.					
R	76.394		M.	SE		M/M.					
T	12.332		M.	T _g		M.					
L	24.464		M.	W		M.					
SE. ATTAINED STA.				TO STA.							
SE. REMOVED STA.				TO STA.							

CURVE DATA NO. 6											
PI. STA. 1+165.428											
?	31'-40'-4.00"	LT	E	2.073	M.	?	31'-40'-4.00"	LT	E	2.073	M.
D	76'-00'-00"		SE		KPH.	D	76'-00'-00"		SE		KPH.
R	75.389	M.	Ta		M/M.	R	75.389	M.	Ta		M/M.
T	21.381	M.	W		M.	T	21.381	M.	W		M.
L	41.668	M.				L	41.668	M.			
SE. ATTAINED STA.					TO STA.	SE. ATTAINED STA.					TO STA.
SE. REMOVED STA.					TO STA.	SE. REMOVED STA.					TO STA.

CURVE DATA NO. 10											
PI. STA. 1+392.390											
?	22'-29'-40.00" RT		E	1.496	M.						
D	75'-00'-00"		SPEED		KPH.						
R	76.384 M.		SE		M/M.						
T	16.192 M.		Ta		M.						
L	29.993 M.		W		M.						
SE. ATTAINED STA.						TO STA.					
SE. REMOVED STA.						TO STA.					

CURVE DATA NO. 3											
PI. STA. 0+883.122						PI. STA. 0+883.122					
?	= 84°-39'-43.00" LT		E	= 2.904 M.							
D	= 675'-00'-00"		SE	= --		KPH.					
R	= 8.488 M.		SE	= --		M/M.					
T	= 7.732 M.		Ta	= --		M.					
L	= 12.643 M.		W	= --		M.					
SE. ATTAINED STA.						TO STA.					
SE. REMOVED STA.						TO STA.					

CURVE DATA NO. 7											
PI. STA. 1+243.901											
?	= 09'-35"-45.00" LT		E	= 0.480 M.							
D	= 42'-00"-00"		SE	= -- -- KPH.							
R	= 136.419 M.		SE	= -- -- M/M.							
T	= 11.460 M.		Ta	= -- -- M.							
L	= 22.047 M.		W	= -- -- M.							
SE. ATTAINED STA.			TO STA.		--						
SE. REMOVED STA.			TO STA.		--						

CURVE DATA NO. 11				PI. STA. 1+428.586	
?	= 78'-48'-41.00"	LT	E	= 1.997	M.
D	= 844'-00'-00"		SE	=	KPH.
R	= 6.789	M.	Ta	=	M/M.
T	= 5.577	M.	W	=	M.
L	= 9.339	M.		=	M.
SE. ATTAINED STA.			TO STA.		
SE. REMOVED STA.			TO STA.		

CURVE DATA NO. 4											
PI. STA. 0+927.055											
?	= 75'-20"-56.00"		RT	E	=	3.993	M.				
D	= 376'-00"-00"			SPEED			KPH.				
R	= 15.155		M.	SE			M/M.				
T	= 11.704		M.	Ta			M.				
L	= 19.034		M.	W			M.				
SE. ATTAINED STA.				TO STA.				-			
SE. REMOVED STA.				TO STA.				-			

CURVE DATA NO. 8											
PI. STA. 1+282.032											
?	= 31'-17"-24.00"	RT	E	= 1.086	M.						
D	= 111'-00'-00"		SPEED	=	KPH.						
R	= 51.618	M.	SE	=	M/M.						
T	= 14.456	M.	Ta	=	M.						
L	= 28.189	M.	W	=	M.						
SE. ATTAINED STA.						TO STA.					
SE. REMOVED STA.						TO STA.					

บริษัท ภาทองกรู๊ป การโยธา จำกัด
PHUTHONGGROUP CIVIL CO.,LTD.

ผู้ว่าราชการจังหวัด...
ผู้ช่วย...
พยาน...
พยาน...




สำเนาถูกต้อง
(นายมานิช กิ่งเรียน)
ผู้อำนวยการกองช่าง









[illegible]










สำเนาถูกต้อง
(นายมานิช กงเลียม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้จัดทำ *SP*
ผู้รับจ้าง *SP*
พยาน *[Signature]*
พยาน *อนัน*

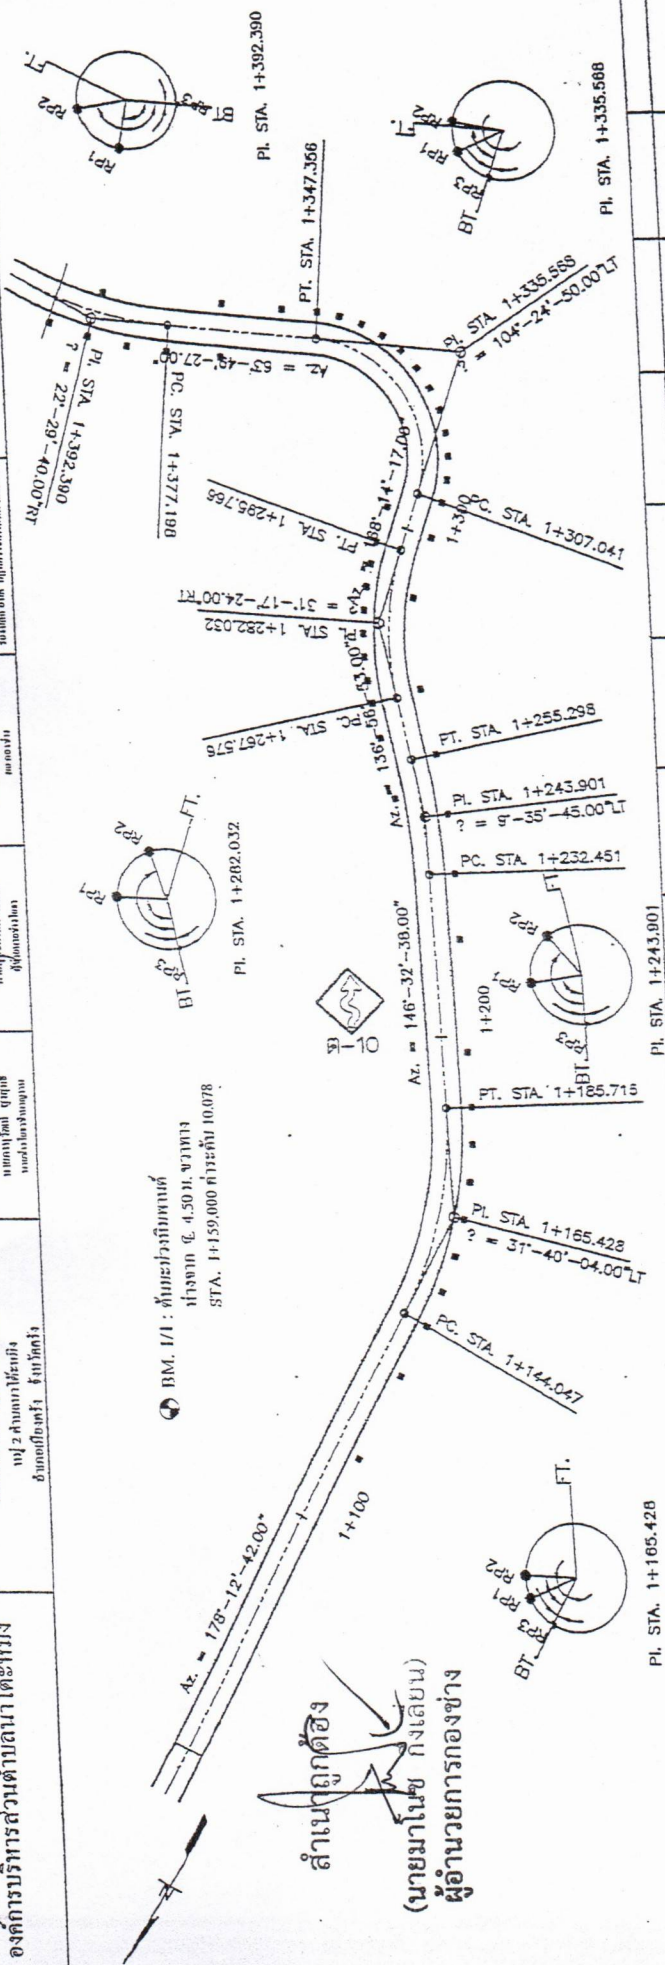

[illegible][illegible]

[illegible]



WESTERN CIVILIZATION

(นายมานะ เกษมทรัพย์ กิ่งเคียน)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไต่ะมาเมือง

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
จากถนนพหลโยธินถึงถนนพหลโยธิน กม. 0.50-0.16
สายหลวง - พหลโยธิน (ตข. 12)
พ. 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก

တရားရုံးချုပ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊
ဧပြီလ ၁၀ ရက်၊ ၁၉၄၆ ခုနှစ်

Signature: _____

1975

Mytha

၁၀၀၀
အထက်
အောက်

1

[illegible]

--	--	--	--



















1		
1		


1		

		025.00
--	--	--------


[illegible][illegible]

10 9 8

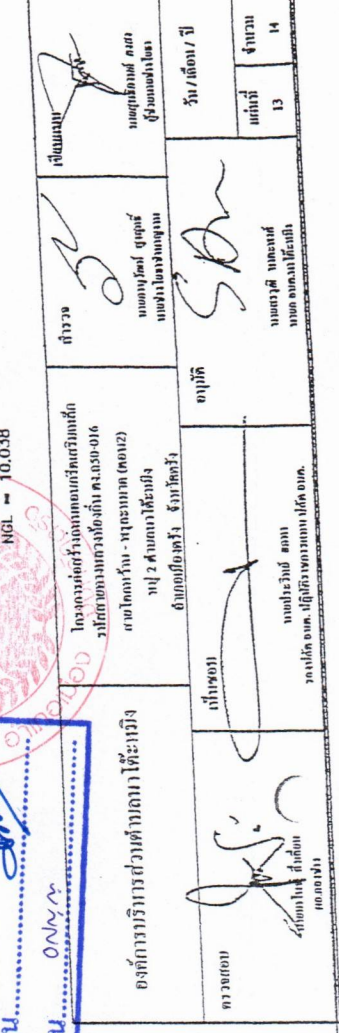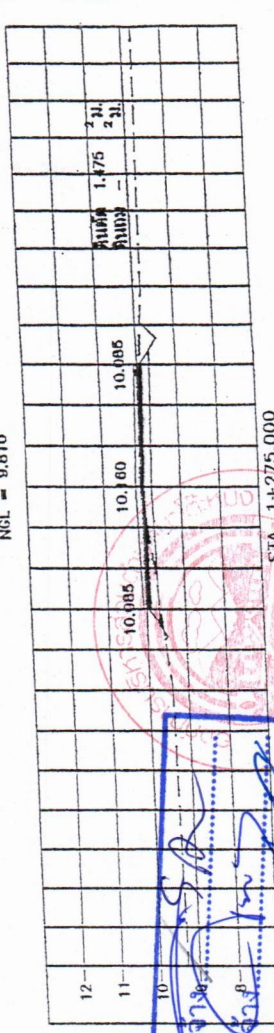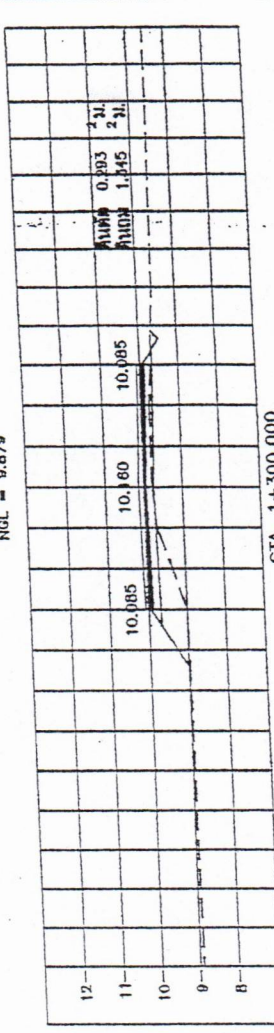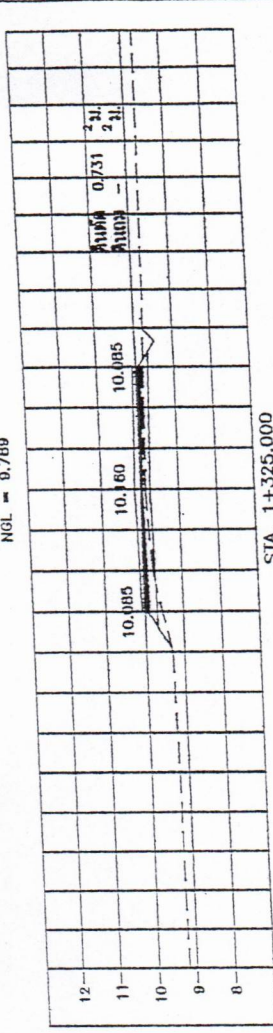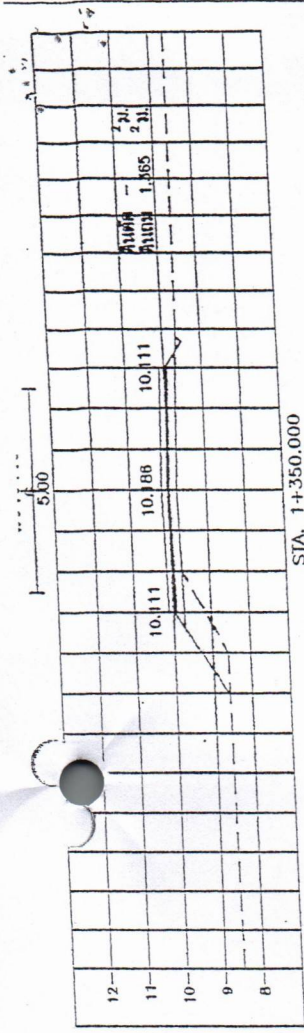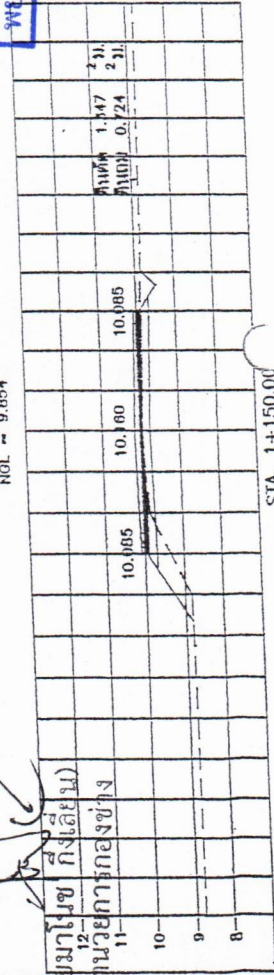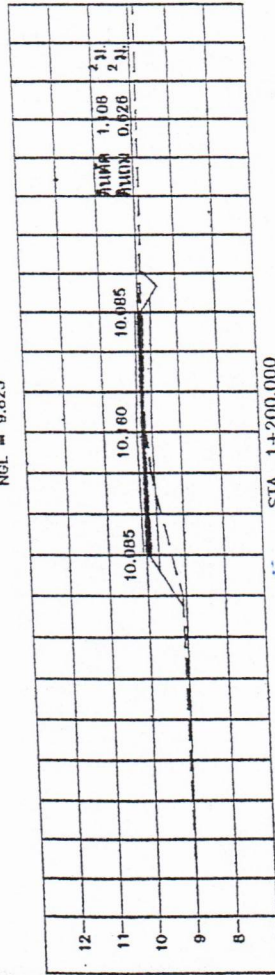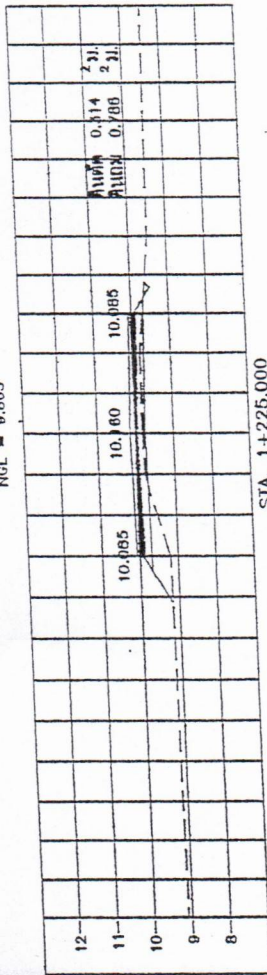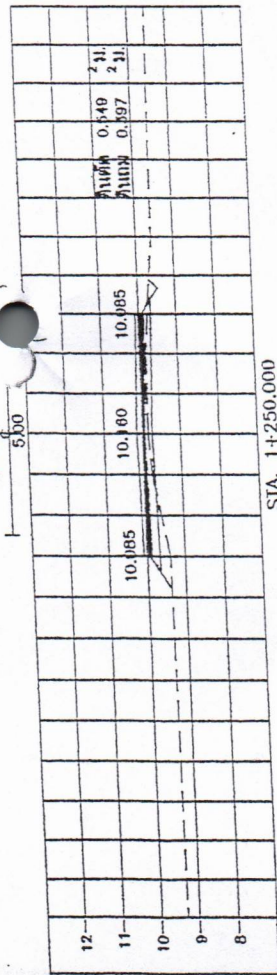





STA. 1+475.000
NGL. = 10.102




STA. 1+450.000
NGL = 10.358

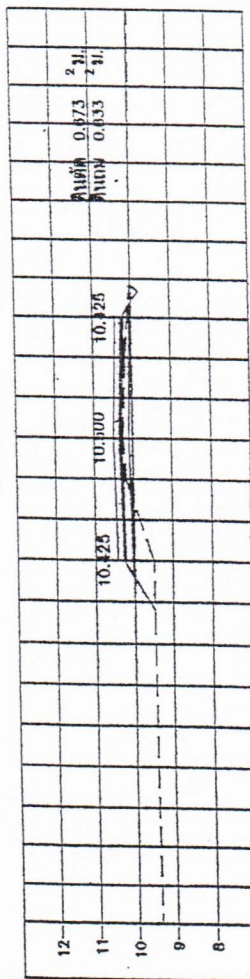


STA. 1+425.000
NGL. 10.283




STA.	1+400.000
NGL.	10.359




STA. 1+375.00
NQL = 10.189

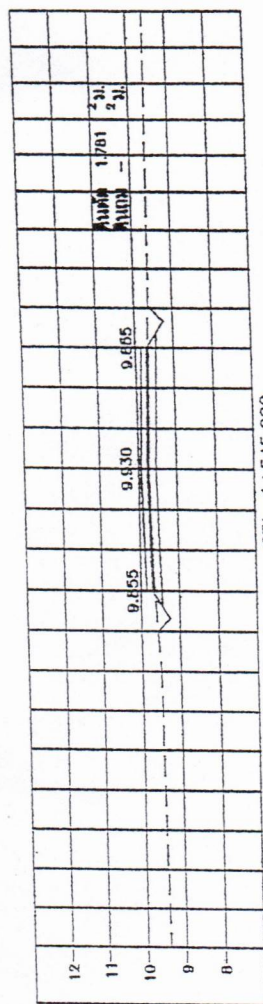

STA. 1+545.000
NGL = 9.748

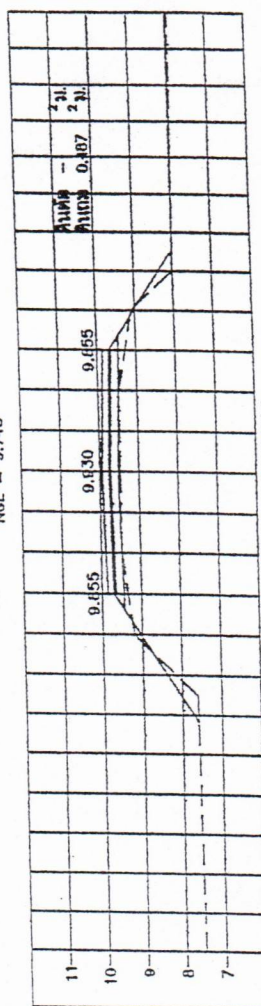

SIA. 1+525.000
NGL = 9.474



STA. 1+500.000
NGL - 9.598

10-.....
 ผู้ว่าราชการจังหวัด.....
 ผู้สมัคร.....
 พยาน.....
 พยาน.....
 พยาน.....

(บุญมาในช กงเลียบ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริวารผ่านคำบอกเล่าใต้ทะเลจึง

โครงการก่อสร้างถนนกม.ที่ ๓๖๖-๐๑๖
กม.ที่ ๓๖๖-๐๑๖
สายโคกวัน - หูกะบาก (ตม.๒)

1770

[Signature]

James L. Gordon

[illegible]

52

ปี / เดือน / วัน	เลข	ปี
	เลข	ปี

หลักฐานการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง

เอกสารฉบับนี้ได้จัดทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง ตำบลนาโตะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง โดย นายสรุฒิ นาคะพงศ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ภูทองกรุ๊ป การโยธา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดตรัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ ๕๔/๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง โดยนายวิศิษฐ์ เก่งธนทรัพย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรอง ของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดตรัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นผู้รับจ้างดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๕๐-๐๑๖ สายโคกหวาน - พลุละหมาด (ตอน ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโตะหมิง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๗๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญารวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เอกสารนี้แสดงเป็นหลักฐานว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง ได้ดำเนินการส่งมอบพื้นที่เพื่อให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ทั้งสองฝ่ายจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และมอบไว้เป็นหลักฐานฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสรุฒิ นาคะพงศ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิศิษฐ์ เก่งธนทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวมลฤดี ทองมาก)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอภิญญา สีสุข)



บริษัท ภูทองกรุ๊ป การโยธา จำกัด
PHUTHONGGROUP CIVIL CO.,LTD.
